

INFORME DE AVANCES · CORTE 10 DE NOVIEMBRE DE 2026

Trazo: avances del proyecto final

Bitácora día a día, estado frente al plan, repositorio, código por fecha y capturas de la aplicación móvil de consulta psicológica con programa solidario post-sismo.

ESTUDIANTE

Juan José Pantoja Ordoñez
Ingeniería de Software, 8.º semestre
Universidad Visión de las Américas

ASIGNATURA

Desarrollo Móvil 2
Avances del proyecto final
Aliada: Angela Sophia Córdoba, psicóloga

REPOSITORIO

github.com/MrxHuaang/trazo
Rama activa: feat/mvp-sprints
Pull request n.º 1 abierto

01

Resumen del avance

Trazo es una app móvil en React Native + Expo para organizar la consulta de una psicóloga independiente (agenda, pacientes, recordatorios, pagos, notas) con un módulo solidario para atender a personas afectadas por el sismo del 10 de agosto de 2026 en Pereira. A la fecha están listos el documento maestro, el sistema visual, la capa de datos y la pantalla principal funcionando en el emulador; los módulos restantes están en desarrollo en ramas separadas.

3 días
de trabajo registrados (8, 9 y 10 de noviembre)

9
commits en el repositorio público, más 3 en rama de módulo

126
archivos cambiados frente a la plantilla inicial (+10.796 líneas)

46 págs.
documento maestro v0.2 con requerimientos, diseño y arquitectura

1.1 Enlaces

Repositorio (público)	https://github.com/MrxHuaang/trazo
Pull request de la base	https://github.com/MrxHuaang/trazo/pull/1
Rama con el trabajo más reciente	`feat/mvp-sprints`
Documento maestro	`01_Documentacion_y_repositorio/Trazo_Documento_Maestro_v0.2.pdf` (en esta carpeta)

1.2 Qué hay en esta carpeta

CARPETA O ARCHIVO	CONTENIDO
00_Informe_de_avances_Trazo.pdf	Este informe.
01_Documentacion_y_repositorio	Documento maestro v0.2 (PDF), enlace al repositorio y copia completa del código fuente en ZIP.
02_Dia1_2026-11-08_Planeacion_y_diseno	Fuentes del documento maestro y del sistema de generación de PDF.
03_Dia2_2026-11-09_Base_y_sistema_visual	Código del sistema visual Trazo suave, componentes, navegación y primera pantalla.
04_Dia2_2026-11-09_Capa_de_datos	Base de datos local, dominio, repositorios, hooks y datos de demostración.
05_Dia2_2026-11-09_Modulo_Hoy_y_pagos	Pantalla Hoy con datos reales, recordatorios por WhatsApp y pagos (rama de módulo).
06_Dia3_2026-11-10_Modulos_en_desarrollo	Corte del código en curso de agenda, pacientes, solidario y acceso.
07_Capturas	Capturas de la app corriendo en el emulador Pixel 8.

Cada carpeta de código trae un archivo `LEEME.md` con la ruta original de cada archivo en el repositorio, el commit del que se tomó y qué hace. Los nombres usan `__` en lugar de `/` (por ejemplo, `theme__tokens.ts` es `src/theme/tokens.ts`).

02

Bitácora día a día

Registro de lo que se hizo cada día, con el resultado y la evidencia (commit o documento). Las horas son de Colombia y corresponden a las marcas de tiempo de Git.

2.1 Día 1 · domingo 8 de noviembre · Planeación y diseño

ACTIVIDAD	QUÉ SE HIZO	RESULTADO O EVIDENCIA
Contexto y problema	Lectura de la carta de aceptación. Investigación del sismo del 10 de agosto (cifras de afectados, respuesta en salud mental, líneas de ayuda de Risaralda) y de cómo trabaja una psicóloga independiente.	Capítulos 2 y 3 del documento maestro.
Definición del producto	Se evaluaron cinco alternativas (agenda, seguimiento psicosocial, jornadas, app para pacientes, agendador para negocios). Se eligió consulta como núcleo y programa solidario como módulo.	Capítulo 4, tabla de alternativas.
Requerimientos	27 historias de usuario con prioridad MoSCoW, criterios de aceptación de las historias clave, 10 reglas de negocio y 9 requisitos no funcionales.	Capítulos 5 y 6.
Stack	Comparación Flutter vs. React Native. Se eligió React Native + Expo SDK 58 porque es lo del curso y permite probar en iPhone sin Mac y sin costo (Expo Go). Verificación de versiones y planes gratuitos.	Capítulos 8 y 10; ADR-001 y ADR-002.
Diseño visual	Se descartaron neumorphism, glassmorphism y una primera paleta cálida por genérica. Se exploraron cuatro direcciones y se definió *Trazo suave*: bloques pastel por tipo de información y una línea de sismógrafo que se calma como firma. Tokens de color, tipografía y formas.	Capítulo 7 con wireframes de cuatro pantallas.
Arquitectura y datos	Arquitectura por funcionalidades, modelo entidad-relación, reglas de seguridad y privacidad (Ley 1581 de 2012, Ley 1090 de 2006).	Capítulos 8, 9 y 14.
Plan	Plan de trabajo por sprints, riesgos, costos (cero) y diferencias entre Pixel 8 (pruebas) e iPhone (destino).	Capítulos 10 a 15.
Documento	Sistema propio para generar el PDF desde HTML con Edge sin interfaz (`docs/build.py`).	Documento maestro v0.2, 46 páginas.

2.2 Día 2 · lunes 9 de noviembre · Base, sistema visual y datos

HORA	ACTIVIDAD	QUÉ SE HIZO	COMMIT
00:17	**Proyecto**	Creación del proyecto con `create-expo-app` (Expo SDK 58, React Native 0.88, Expo Router, TypeScript estricto).	`da07a45`
01:14	**Sistema visual**	Tokens (`src/theme`), fuentes Bricolage Grotesque, Geist y Geist Mono, componentes reutilizables (`TraceLine` , `Tile` , `HatchOverlay` , `Fab` , `ListRow` , `Chip` , `EmptyState` , `Screen`), pestañas nativas, pantalla Hoy, ícono y pantalla de carga. ESLint y reglas del proyecto.	`c381b24`

HORA	ACTIVIDAD	QUÉ SE HIZO	COMMIT
Mañana	**Pruebas en emulador**	Puesta en marcha en el emulador Pixel 8 con Expo Go 58. Se resolvió un fallo de descarga del paquete por red local usando `adb reverse`.	Capturas en 07_Capturas
12:57	**Correcciones Android**	La textura solidaria no cubría el bloque y las pestañas solo mostraban la etiqueta activa. Se rehízo la textura con líneas medidas y se activaron las etiquetas.	`723dd9e`
12:58	**Nombre**	La app pasó de llamarse Sostén a Trazo (nombre visible, identificadores, textos).	`8242443`
13:06	**Repositorio**	Revisión de secretos, repositorio público en GitHub, documento maestro dentro del repo y pull request n.º 1.	`b26481e`
13:21	**Capa de datos**	Base de datos local SQLite con migraciones, tipos de dominio, repositorios (consultorio, pacientes, citas, pagos, seguimientos), hooks de TanStack Query, datos ficticios de demostración, utilidades de fechas en hora de Colombia, formato de moneda y WhatsApp, componentes de formulario y rutas de cada módulo.	`9ec7ccd`
13:35	**Módulo Hoy**	Pantalla Hoy conectada a la base de datos (próxima cita, pendientes, solicitudes, seguimientos) y hoja “Por confirmar” con recordatorio por WhatsApp.	`b75311b`, `79270e5` (rama de módulo)
13:38	**Módulo Pagos**	Resumen mensual (cobrado, pendiente, donado), registro de pagos por método y exportación del mes a PDF.	`c95d2ff` (rama de módulo)

2.3 Día 3 · martes 10 de noviembre · Módulos en desarrollo

MÓDULO	ALCANCE	ESTADO AL CORTE
Agenda	Línea de tiempo del día, crear cita tocando un hueco, detalle con cambio de estado, avisos locales, disponibilidad y bloqueos.	EN DESARROLLO
Pacientes	Buscador con creación en contexto, ficha con historia, autorización de datos, notas privadas bajo bloqueo, exportar a PDF.	EN DESARROLLO
Solidario	Cupos solidarios, jornadas con asistentes, seguimientos, líneas de ayuda, informe de impacto.	EN DESARROLLO
Acceso y ajustes	Bienvenida (crear consultorio o cargar demostración), bloqueo al abrir, ajustes.	EN DESARROLLO
Hoy y pagos	Plantillas de mensajes de WhatsApp editables, con variables y vista previa (commit `1ec6bb3`). Módulo completo en su rama; tipos y lint en verde.	LISTO PARA INTEGRAR
Informe de avances	Este informe y el paquete de código por día.	HECHO

Cada módulo se trabaja en su propia rama a partir de `feat/mvp-sprints` y solo toca sus archivos (tabla de propiedad en `AGENTS.md`), para integrarlos sin conflictos. La carpeta 06 contiene el corte del código en curso; todavía no está integrado ni probado en el emulador.

03

Estado frente al plan

SPRINT	OBJETIVO	ENTREGABLES	ESTADO
S0	Diseño y preparación	Documento maestro, sistema visual, repositorio, emulador configurado.	COMPLETO
S1	Fundaciones	Tokens y componentes, navegación, capa de datos, datos de demostración. Bienvenida, bloqueo y pacientes en curso.	PARCIAL
S2	Agenda	Línea de tiempo, citas, disponibilidad, avisos. Regla anti-solapes ya implementada en la capa de datos.	EN DESARROLLO
S3	Consultorio completo	Hoy, recordatorios y pagos listos en rama de módulo. Ficha y notas en curso.	PARCIAL
S4	Programa solidario	Cupos, jornadas, seguimientos, líneas de ayuda.	EN DESARROLLO
S5	Cierre	Integración, pruebas de usabilidad, prueba en iPhone real, video.	PENDIENTE

3.1 Cambios frente al documento maestro

TEMA	CAMBIO	MOTIVO
Nombre	De Sostén a Trazo.	Trazo ya era la firma visual de la app (la línea de sismógrafo).
Persistencia	Base de datos local SQLite en el teléfono en lugar de Supabase en la nube. Supabase queda como adaptador futuro.	Funciona en Expo Go sin cuentas ni costo, y los datos de salud no salen del dispositivo.
Página web de reservas	Se aplaza.	Necesita un servidor; depende de conectar Supabase.

3.2 Cómo ejecutar el proyecto

```
git clone https://github.com/MrxHuaang/trazo.git
cd trazo
git switch feat/mvp-sprints
npm install
npx expo start            # tecla "a": abre el emulador Android con Expo Go 58

# Si Expo Go se queda en "Downloading 100%" en el emulador:
adb reverse tcp:8081 tcp:8081      # y abrir exp://127.0.0.1:8081

npx tsc --noEmit          # tipos
npx expo lint             # estilo
```

La app carga datos ficticios de demostración la primera vez (12 pacientes, citas de dos semanas atrás a dos adelante, pagos, jornadas y líneas de ayuda). Ningún dato corresponde a personas reales.


3.3 Próximos pasos

1. Terminar e integrar los módulos de agenda, pacientes, solidario y acceso en `feat/mvp-sprints`.
2. Probar todos los flujos en el emulador Pixel 8 y revisar la lista de diferencias con iPhone.
3. Prueba en un iPhone real con Expo Go y prueba de usabilidad (SUS) con 3 a 5 personas.
4. Actualizar el documento maestro a la versión 1.0 y grabar el video de demostración.


04

Capturas

La app corriendo en el emulador Pixel 8 (Android) con Expo Go 58, el 9 de noviembre de 2026.

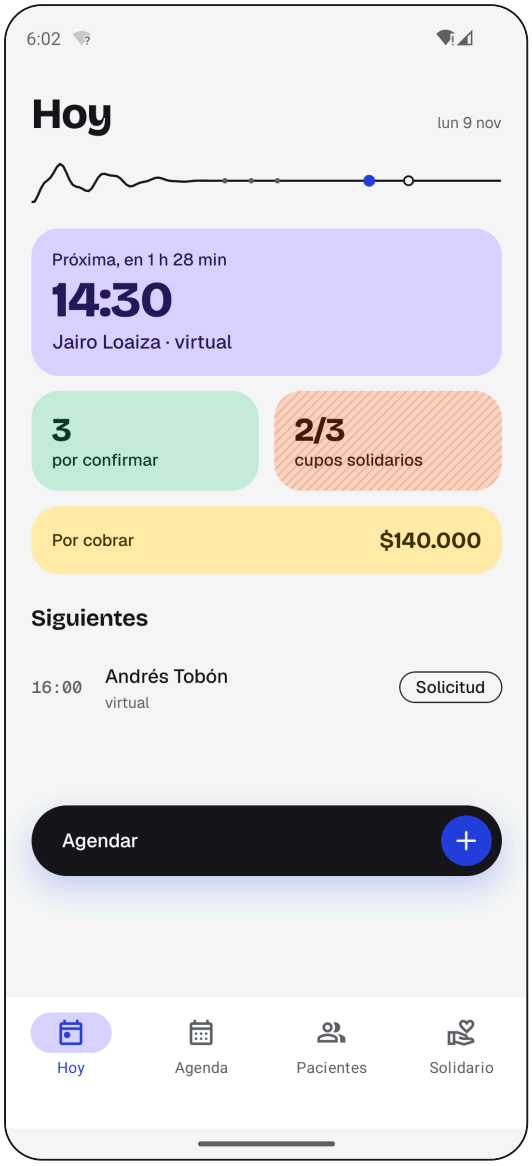

Hoy. Línea del día con las citas como puntos, próxima cita, pendientes por confirmar, cupos solidarios (con textura) y valor por cobrar.

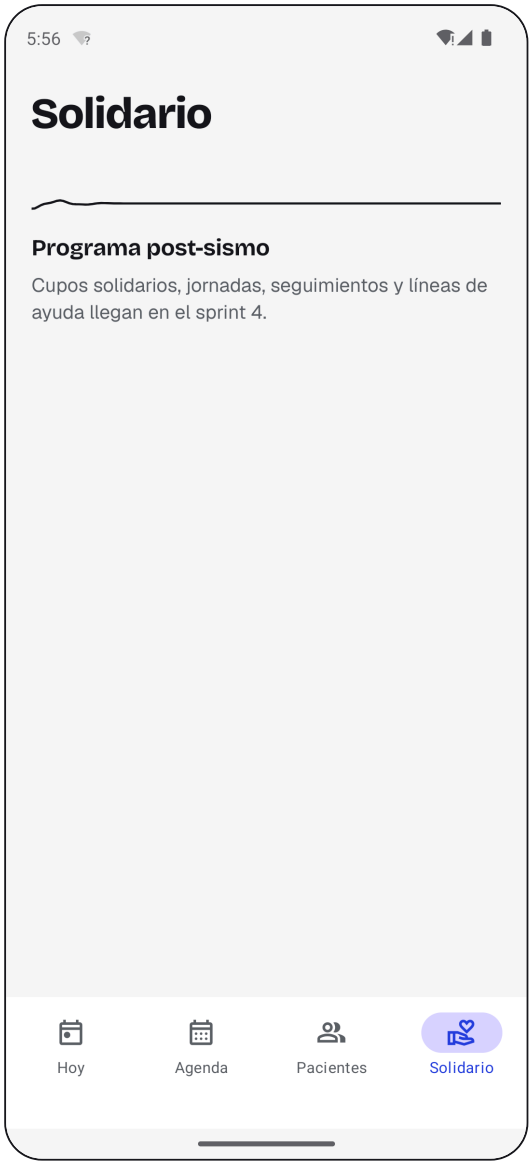

Solidario. Estado vacío provisional con el Trazo en calma; el módulo completo está en desarrollo.
